

# Gestión de Metas Prioritarias

Mecanismo de gestión y seguimiento de las Metas del Ministerio que son de interés presidencial a través de SIGOB

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  
SECRETARÍA DE METAS PRESIDENCIALES



**Ministerio de Seguridad Pública**  
Seguridad - Paz - Prevención



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**PANAMÁ**

# HITOS DE GOBIERNO - PANAMÁ



Ministerio de Seguridad Pública  
Seguridad - Paz - Prevención



2015



2016

Septiembre

Enero

Febrero

Diciembre



ADOPCIÓN ODS



Discurso  
Presidente  
Varela en AG  
2015

-Adopción ODS  
Política de  
Estado



Marco Normativo  
Decreto 393



Arquitectura  
Institucional  
Comisión  
Multisectorial



Discurso  
Presidente  
Varela  
Gran Acuerdo  
Nacional 2030



Instalación de la  
Concertación

Discurso  
Vicepresidenta  
Isabel de Saint  
Malo



Documento  
VISION 2030

Consultas  
Nacionales



# HITOS DE GOBIERNO – TEMA SEGURIDAD



Ministerio de Seguridad Pública  
Seguridad - Paz - Prevención



2015



2016



2017

Septiembre

Enero

Agosto

Septiembre

Diciembre

Enero



Foro: Hacia una política de seguridad ciudadana y prevención de las violencias




Diseño del proceso de consulta para la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana

LA SEGURIDAD ES UN COMPROMISO DE TODO EL PAÍS.

¡PARTICIPE!

Proceso de consulta

- Instancias de seguridad
- Organismos de Justicia
- Instituciones del Estado
- Academia
- Sector Privado
- Iglesias, ONG, Medios, etc.



Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones fuertes

Primeros resultados Encuesta Nacional de Victimización y Percepción



ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana





- ➔ SISTEMA INTEGRADO DE ESTADÍSTICA CRIMINAL
- ➔ INTELIGENCIA (Intercambio de información en el Consejo de Seguridad)




- **Prevención primaria**
  - Actividades en localidades territoriales
  - Programas en Escuelas Primarias (últimos años [11-13] / [15-17])
  - Contacto permanente y presencia en la comunidad
- **Prevención secundaria**
  - Programa de Barrios Seguros (Recuperación de Jóvenes en Riesgo)
    - Mayor exigencia en los resultados (beneficiario)
    - No es un Plan de Impunidad
    - Se evaluaron los resultados y se corrigieron los inconvenientes
      - Mayor cuidado en el uso de los recursos
      - Enfoque de atención de mayor cuidado para los jóvenes drogo-dependientes
    - Iniciativas mucho más coordinadas con el Ministerio de Educación
      - Identificar el nivel de escolaridad de los jóvenes asistentes al programa





## • MECANISMO OFICIAL DEL GOBIERNO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS PRESIDENCIALES

- ▶ HERRAMIENTA DE PERMANENTE CONSULTA DE LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL PRESIDENTE / MINISTROS
- ▶ OBJETIVO: **MOVILIZAR LA GESTIÓN** DE LAS METAS CON LOS RECURSOS DE LOS MINISTERIOS EXISTENTES A TRAVÉS DE LAS **MESAS DE METAS MINISTERIALES**
- ▶ MÉTODO PARA FACILITAR LA **RESOLUCIÓN** DE ALERTAS / RESTRICCIONES Y APROVECHAR OPORTUNIDADES COMUNICACIONALES PARA LA AGENDA DEL TITULAR DEL MINISTERIO O DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
- ▶ RED DE 400 FUNCIONARIOS A LA FECHA QUE COLABORAN PARA MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE AVANCE, 17 METAS PRIORITARIAS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD
- ▶ CAPACIDAD DE **CONECTAR Y VALIDAR** LA INFORMACIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTAL CON EL **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**



# TABLERO DE CONTROL DE METAS DE SIGOB



**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE METAS PRESIDENCIALES  
(2) USUARIOS ACTIVOS EN ESTE MOMENTO

Ministro de Seguridad  
(COMITÉ DE METAS PRES)

Metas Filtro Visualización

Guardar Opciones  
 MOSTRAR RESTRICCIONES  
 MOSTRAR PRESUPUESTO  
 Obtener Opciones  
 MOSTRAR ALERTAS  
 INFORMACIÓN ADICIONAL  
 MOSTRAR CANTIDAD EN AGRUPADOR  
 Eliminar Opciones  
 MOSTRAR METAS INTERMEDIAS

Visualización Agrupación

	FECHA FINALIZACIÓN	RESTRICCIONES			ALERTAS			GES	ATR	REP	OP	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
<b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CUSTODIA - PACORA</b> MINISTERIO DE GOBIERNO / TEJADA, EMMA	31 JUL. 2016 VENCIÓ: -116 DÍAS.	0	0	0	0	1	0	4	0	0	1	B/. 1,094,268	B/. 972,454
<b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRANSICIÓN - PACORA</b> MINISTERIO DE GOBIERNO / TEJADA, EMMA	30 ENE. 2018 FALTAN: 431 DÍAS.	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	B/. 3,261,797	B/. 606,605
<b>BARRIOS SEGUROS</b> MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA / QUINTERO, FIDEL	01 JUL. 2019 FALTAN: 948 DÍAS.	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	B/. 10,427,309	B/. 2,990,767
<b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CUSTODIA - PACORA</b> MINISTERIO DE GOBIERNO / TEJADA, EMMA	22 ENE. 2018 FALTAN: 423 DÍAS.	0	0	0	0	2	0	8	0	0	0	B/. 8,500,000	B/. 1,450,621
<b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE HERRERA</b> MINISTERIO DE GOBIERNO / TEJADA, EMMA	24 JUN. 2018 FALTAN: 576 DÍAS.	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	B/. 3,494,927	B/. 174,000
<b>MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE CUSTODIA Y CUMPLIMIENTO</b> MINISTERIO DE GOBIERNO / TEJADA, EMMA	30 SEP. 2019 FALTAN: 1039 DÍAS.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	B/. 1,293,900	B/. 0
<b>IDENTIFICACIÓN DEL TERRENO PARA EL NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE HERRERA Y LOS SANTOS</b> MINISTERIO DE GOBIERNO / CHAN, MARIO	30 DIC. 2016 FALTAN: 35 DÍAS.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0		

Plataforma para Control de Alertas/Restricciones

17 Prioridades BARRIOS SEGUROS

Información de Presupuesto



# FICHA DE META – BARRIO SEGURO



**Metas Presidenciales de Gobierno 2014-2019**

**BARRIOS SEGUROS**  
Ministerio de Seguridad Pública

1 Información de Base 2 Metas Intermedias 3 Consulta de Alertas 4 Consulta de Restricciones 5 Consulta de Oportunidades 6 Registro de Documentos 7 Reporte resumen 8 Indicadores

Info. de Base Trabajos para Reporte Semanal Reporte Mensual

Quedan 948 días para su cumplimiento.  
Meta con últimos cambios registrados el 3/10/16 4:55:35 p. m. por Quintero, Fidel

Datos generales  
Histórico  
Reporte Impreso  
Reporte Completo  
Presupuesto

Responsable : Quintero, Fidel  
Área Responsable : Ministerio de Seguridad Pública  
Fecha Inicio : 7/7/14  
Estado de gestión : Gestión Normal

Detalle Info. Contratación Línea de base

Beneficiarios: 7000  
Costo: 133400000  
Ejecutado: 2990767

Ejecución de recursos de oficina y equipos tecnológicos 07/31/2015  
Entrega de Vehículos 07/31/2015  
Aprobación de Decreto Ejecutivo 07/31/2015  
Sensibilización de Antipandillas y la Policía Nacional en materia de DESARROLLO ESPIRITUALES al finalizar el 2015.  
800 personas como mínimo deben haber culminado el Curso de CA...  
electricidad, soldad... (rendurismo, entre otros) al finalizar e...  
300 personas deben... CERTADO al sistema productivo o ed...

Calendario Anual Calendario Mensual

mayo							junio							julio							agosto										
	l	m	m	j	v	s	d		l	m	m	j	v	s	d		l	m	m	j	v	s	d		l	m	m	j	v	s	d
18	25	26	27	28	29	30	1	23	30	31	1	2	3	4	5	27	27	28	29	30	1	2	3	31	25	26	27	28	29	30	31
19	2	3	4	5	6	7	8	24	6	7	8	9	10	11	12	28	4	5	6	7	8	9	10	32	1	2	3	4	5	6	7
20	9	10	11	12	13	14	15	25	13	14	15	16	17	18	19	29	11	12	13	14	15	16	17	33	8	9	10	11	12	13	14
21	16	17	18	19	20	21	22	26	20	21	22	23	24	25	26	30	18	19	20	21	22	23	24	34	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	27	27	28	29	30	1	2	3	25	26	27	28	29	30	31	35	22	23	24	25	26	27	28	
23	30	1	2	3	4	5	6	28	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	36	29	30	31	1	2	3	4	

septiembre octubre noviembre diciembre

Información sustantiva de la Meta Ministerial

Calendario de Metas Intermedias

# FASE 2: INDICADORES (MEDICIÓN Y TRANSPARENCIA)



Secretaría de Metas de Panamá

**BARRIOS SEGUROS**  
Ministerio de Seguridad Pública

Ver Sitio Web

1 Información de Base 2 Metas Intermedias 3 Reporte Ejecutivo

Consulta de Alertas Consulta de Restricciones Consulta de Oportunidades Registro de Documentos

Info. de Base Trabajos para Reporte Semanal Reporte Mensual

Se han registrado 2 Indicadores para esta Meta

Lista de Indicadores

Lista Simple Lista con Gráfica

**JÓVENES EN RIESGO CON ASISTENCIA PSICOLÓGICA**

Estado: Alerta  
Unidad: Unidad  
Actualizado: Hace 1 días  
Fecha de corte: 21 oct 2014  
Frecuencia: Trimestral  
Avance: 16 %

Resumen:  
Acceso a servicios de abastecimiento de agua para consumo humano en condiciones adecuadas: calidad, cantidad y sostenibilidad, en 10

PERÍODO	META	AVANCE	%
Año: 2014			
3° Trimestre 2014	35,00	24,00	68,5
4° Trimestre 2014	35,00	0,00	0
Año: 2015			
1° Trimestre 2015	10,00	0,00	0
2° Trimestre 2015	10,00	0,00	0
3° Trimestre 2015	10,00	0,00	0

Ver información regional

Seguimiento periódico de avance del Indicador (regionalización soportada)

Comparación frente a la línea de base (termómetro)

# DASHBOARD – CONSULTA GERENCIAL



Ministerio de Seguridad Pública  
Seguridad - Paz - Prevención

## INFORMACIÓN ESTADÍSTICA + REGIONALIZACIÓN + PRESUPUESTOS




República de Panamá  
Metas de Gobierno

USUARIO SIGOB


- CONSULTORÍA EN GESTIÓN
- Dashboard
- Plan Estratégico (PEG)
- Metas Emblemáticas
- Localización
- Institución
- Etapas de licitación
- Origen de la Meta
- Tipos de Proyecto
- PENCYT - Programas
- Tipo de Ejecución
- Estadísticas
- Reporte Resumen
- Gestión de Metas

Inicio / Dashboard



Opciones  
Consulta

PERIODO DE GESTIÓN

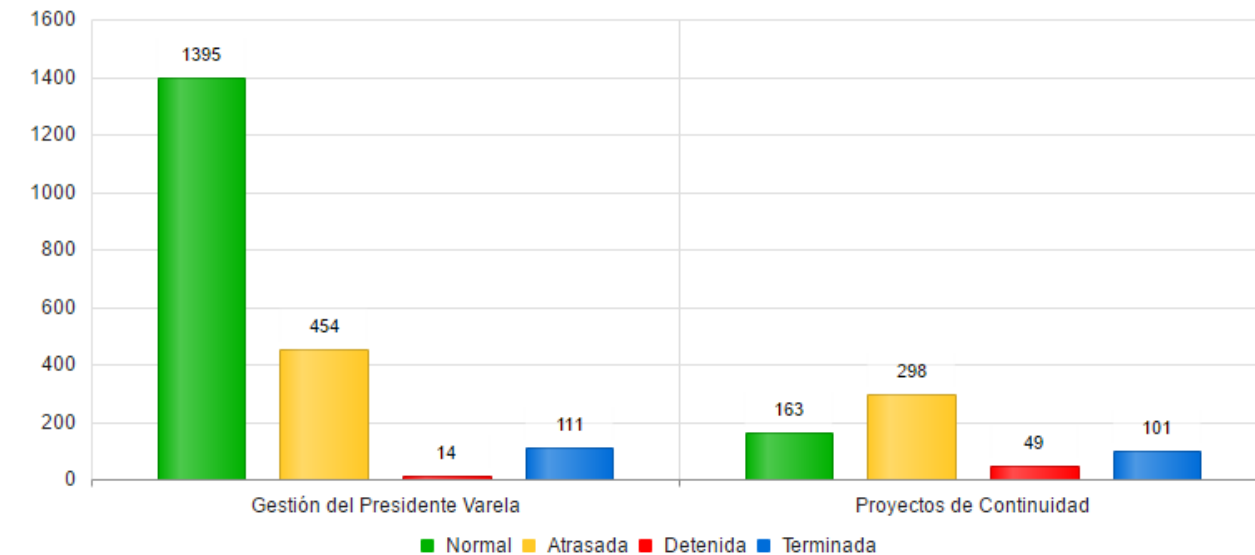

# DASHBOARD – CONSULTA GERENCIAL



Ministerio de Seguridad Pública  
Seguridad - Paz - Prevención



República de Panamá  
Metas de Gobierno

Inicio / Consulta Metas

USUARIO SIGOB

Dashboard

Plan Estratégico (PEG)

Metas Emblemáticas

Localización

Institución

Etapas de licitación

Origen de la Meta

Tipos de Proyecto

PENCYT - Programas

Tipo de Ejecución

Estadísticas

Reporte Resumen

Gestión de Metas

Metas Emblemáticas

1437 Metas



P B/. 1,437,022,730

E B/. 586,080,590



Criterios de Consulta

2016

			PROGRAMADO 2016	EJECUTADO 2016	
<input type="checkbox"/>	<b>621 Metas</b>	PLAN 100/0 (SANEAMIENTO Y AGUA)	B/. 364,853,595	B/. 92,450,131	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>529 Metas</b>	MI ESCUELA PRIMERO	B/. 61,174,459	B/. 10,252,272	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>152 Metas</b>	TECHOS DE ESPERANZA	B/. 130,201,327	B/. 64,935,840	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>103 Metas</b>	PACTO POR EL AGRO	B/. 157,649,663	B/. 98,880,545	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>38 Metas</b>	RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN	B/. 23,257,306	B/. 71,373,370	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>11 Metas</b>	BARRIOS SEGUROS	B/. 5,649,563	B/. 1,450,621	<input type="checkbox"/>

- Cantidad de metas
- Presupuesto x año

# DASHBOARD – CONSULTA GERENCIAL



Ministerio de Seguridad Pública  
Seguridad - Paz - Prevención



República de Panamá  
Metas de Gobierno

[Inicio](#) / [Consulta Metas](#)

USUARIO SIGOB

Dashboard

Plan Estratégico (PEG)

**Metas Emblemáticas**

Localización

Institución

Etapas de licitación

Origen de la Meta

Tipos de Proyecto

PENCYT - Programas

Tipo de Ejecución

Estadísticas

Reporte Resumen

Gestión de Metas

## BARRIOS SEGUROS 11 Metas



Metas

Indicador de Estado

Presupuesto

Consulta

Título	Reporte resumen		Presupuesto 2016
<b>Institución: INADEH</b>			
BARRIOS SEGUROS – PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INADEH Finaliza en 3 años	Planificación de capacitaciones.	 	B/. 2,500,000 B/. 0
<b>Institución: Ministerio de Gobierno</b>			
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CUSTODIA - PACORA Ministerio de Gobierno Finaliza en un año	Avance: Físico: 3% Anteproyectos Aprobados, desarrollo de planos por parte del Contratista Financiero: 20% ejecutado pago de anticipo- Actualmente: Contratista adelanta di...	 	B/. 3,000,000 B/. 1,450,621
<b>Institución: Ministerio de Seguridad Pública</b>			
BARRIOS SEGUROS Ministerio de Seguridad Pública Finaliza en 3 años	El programa está implementado en las siguientes provincias: Panamá, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. Para el Año 2016 (según informe recibido del...	 	B/. 0 B/. 0
<b>Institución: Programa de Ayuda Nacional</b>			
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO Y PARQUE INFANTIL EN CALLE 2 Programa de Ayuda Nacional Finaliza 14/06/2016	Avance Físico: 0% Avance Financiero: 0% Status: En subsanación por la entidad, en espera de partida presupuestaria ESTADO : Atrasado/Alerta RAZÓN : Hay al menos una Metas Inter...	 	B/. 0 B/. 0

- Estado de Gestión
- Avance
- Ejecución presupuesto
- Indicadores

## ODS: OBJETIVOS, METAS, INDICADORES EN LOS QUE TRABAJA EL GOBIERNO

### ALINEAMIENTO DE ODS E INDICADORES CON *(Realizado)*:

- + 2,000 Inicitivas Gobierno alineadas a los ODS
  - 45 instituciones públicas vincualdas a la ejecución de ODS.
  - 400 organizaciones privadas vinculadas a la ejecución de ODS
  - 21.000 Mill.US\$ Proyectados en las 2013 inicitivas alineadas a los ODS

+ 2,500

INICIATIVAS

48

INSTITUCIONES

149

ORGANIZACIONES

21 K

MILLONES DE \$

### ANALISIS REALIZADOS: *(Realizado)*

- Grados de concentración de las Inicitivas Gobierno en las ODS.
- Territorialización de las ODS
- Organizaciones públicas y privados por ODS
- Organizaciones públicas y privados por ODS y territorio.
- Empresas vinculadas a las Inicitivas alineadas por ODS.
- Beneficiarios por ODS (a mejorar desde la fuente de información)
- Montos de inversión proyectados a gastar en los ODS



2.077

Iniciativas

+ información ↻



48

Instituciones

+ información ↻



415

Empresas y Organizaciones Civiles

+ información ↻



21.626.599.088,9

Inversión

+ información ↻



Alineación Iniciativas



	1 Fin de la Pobreza	11	0.53 %
	2 Hambre Cero	132	6.36 %
	3 Salud y Bienestar	379	18.25 %
	4 Educación d		
	5 Igual de Gén		
	6 Agua Limpia		
	7 Energía Asequible y no Contaminante	29	1.40 %
	8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico	204	9.82 %
	9 Industria, Innovación e Infraestructura	459	22.10 %
	10 Reducción de las Desigualdades	28	1.35 %
	11 Ciudades y Comunidades Sostenibles	281	13.53 %

16



**Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones fuertes**

